

～ 香取市 通学路交通安全プログラム ～

平成26年度 香取市 通学路合同点検及び安全対策の記録

香取市通学路安全推進会議

香取市では、平成26年3月に策定された「香取市通学路交通安全プログラム」に基づき、平成26年から関係機関による通学路合同点検及び安全対策を継続的に実施しています。

平成26年度は、佐原・栗源地区の13校の小学校から挙げられた危険箇所を精査し、特に緊急性のある9箇所について、平成26年7月に合同点検を実施しました。

この合同点検を受け、関係機関が連携して安全対策を施し、通学路の安全性を高めました。

平成27年度は、小見川・山田地区の合同点検及び安全対策を実施する予定です。



通学路合同点検の様子（平成26年7月14日実施）

香取警察署、千葉県香取土木事務所、香取市道路河川管理課、同環境安全課、同学校教育課、各学校（管理職や保護者）が危険箇所で一室に会し、道路の危険性、安全対策について話し合いました。



平成26年度 香取市通学路合同点検実施箇所一覧表

No	箇所名	学校	状況	対策内容	事業主体
1	佐原小学校体育館前から旧給食センターまでの市道	佐原小学校	道幅が狭い上に両方向から車の通行が多い。見通しも悪く危険である。	通行車両に注意喚起を促す看板の設置	環境安全課
				継続的な交通安全指導 定期的な職員・保護者による現場での登校指導	佐原小学校
2	国道356号からJR大戸駅入り口の三叉路交差点	東大戸小学校	横断歩道の待機場所が狭く、交通量も多く危険である。	ポストコーンの設置及び外側線の引き直し	香取土木事務所
				継続的な交通安全指導	東大戸小学校
3	学校前から大戸駅踏切前交差点までの市道	東大戸小学校	交通量が多い上に、道路幅が狭く歩道もない。また、変則の交差点が多い。	新たな幅広い外側線の設置	環境安全課
				路側帯内での歩行や自転車通行についての安全指導の徹底（※佐原五中との連携含む）	東大戸小学校
4	国道51号から与倉地区に入る市道	竟成小学校	国道51号の抜け道として走行する車が多く、通行速度も速い。道幅も狭く、危険である。	通行車両に注意喚起を促す看板の設置	環境安全課
				継続的な交通安全指導	竟成小学校
5	本矢作天宮神社前交差点	福田小学校	変則的な十字路で見通しが悪い。走って来る車が見えないことがある。横断歩道手前の歩道が狭くなっている危険である。	路側帯の土砂撤去及び歩道ブロックの改修	道路河川管理課
				外側線、中央線の引き直し	環境安全課
6	香取駐在所前から丁子入口間の市道	香取小学校	道が狭く、カーブになっていて見通しが悪い。自転車の接触事故が発生している。	通行車両に注意喚起を促す看板の設置 大きいカーブミラーへの付け替え	環境安全課
				香取中学校と連携した継続的な交通安全指導	香取小学校
7	下小野地区稲荷神社前交差点	神南小学校	交通量が多く、カーブの為見通しが悪い。横断歩道がない道路を横断することになる。	通行車両に注意喚起を促す看板の設置	環境安全課
				横断歩道のない道路での安全な道路横断等の継続的な交通安全指導	神南小学校
8	県道101号 (利根川堤防手前付近道路)	北佐原小学校	カーブで見通しが悪い。車の往来が激しく道路横断の危険性が高い。横断歩道が薄く消えかかっている。	横断歩道の移設 停止線、ダイヤモンドの引き直し	香取警察署
				歩行者待機場所の設置 外側線、センターライン、減速マークの引き直し	香取土木事務所
9	県道55号 (千葉交通野口前バス停付近道路)	香取小学校	横断歩道がなく、交通量も多い。	横断歩道設置	香取警察署
				歩行者待機場所の設置	香取土木事務所

香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

①「佐原小学校 体育館前から旧給食センターまでの市道」

安全対策内容


◆通行車両に注意喚起を促す看板を設置しました。(2箇所)

対策後の効果

★登下校時における通行車両の速度低減につながりました。また、通行する車両数が減少傾向にあります。



注意喚起看板の設置

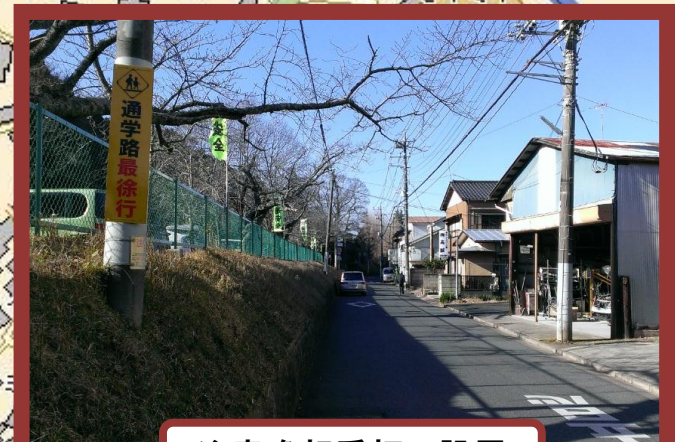

注意喚起看板の設置



香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

②「東大戸小学校 国道356号から JR 大戸駅入り口の三叉路交差点」

安全対策内容

◆デリネーターの周辺にポストコーン3本を設置するとともに、外側線を引き直しました。

対策後の効果

★デリネーターとポストコーンの設置と外側線により、児童の待機場所が確保されました。

★通行車両（特に市道から左折して国道356号に出ようとする車両）の速度低減につながりました。



ポストコーンの設置と外側線の引き直し

香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

③「東大戸小学校 学校前から大戸駅踏切前交差点までの市道」



新たに引かれた外側線



安全対策内容

- ◆東大戸小から大戸駅踏切前交差点までの市道において、幅広く外側線を引きました。(363m)
- ◆児童及び保護者に登下校とも外側線内を歩くよう指示しました。
(東大戸小学校)
- ◆近隣の佐原第五中学校と連携を図り、歩行児童と自転車通学生徒の接触防止の指導を徹底しました。
(東大戸小学校・佐原五中)

対策後の効果

- ★外側線により、歩行エリアが明確になり、児童が安全に歩けるようになりました。
- ★通行車両の速度低減につながりました。

香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

④「竟成小学校 国道51号から与倉地区に入る市道」

安全対策内容

◆通行車両に注意喚起を促す看板を設置しました。(4箇所)

対策後の効果

★登下校時における通行車両の速度低減につながりました。



注意喚起看板の設置



香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所
⑤「福田小学校 本矢作天宮神社前交差点」



本矢作

天宮神社
天照大神宮

安全対策内容

- ◆路側帯の土砂撤去及び歩道ブロックの改修を行い、歩道と待機場所を拡幅しました。
- ◆周辺道路において、外側線(230m)、中央線(60m)を引き直しました。

対策後の効果

- ★歩道と待機場所が拡幅されたことで、道路横断待機時の安全性が向上しました。また、歩行中の転倒等の危険性も軽減されました。
- ★外側線の引き直しにより、歩行者を意識し、通行速度を落として通行する車両が増えました。



香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

⑥「香取小学校 香取駐在所前から丁子入口間の市道」

安全対策内容


- ◆通行時の安全確認がしやすくなるよう、大きなカーブミラーに付け替えました。
- ◆通行車両に注意喚起を促す看板を設置しました。(1箇所)

対策後の効果

- ★児童生徒が、カーブミラーで安全確認をしようとする意識が高まりました。特に、自転車で通行するときは、カーブミラーを見ながら速度を落として安全に通行できるようになりました。
- ★登下校時における通行車両の速度低減につながりました。



カーブミラーの付け替え

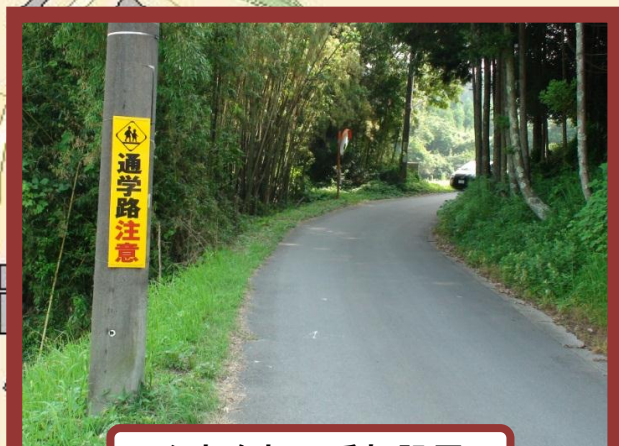

注意喚起の看板設置

香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

⑦「神南小学校 下小野地区稲荷神社前交差点」

安全対策内容

- ◆通行車両に注意喚起を促す看板を設置しました。(1箇所)
- ◆横断歩道のない道路での安全な道路横断の指導を徹底しています。(神南小学校)

対策後の効果

★登下校時における通行車両の速度低減につながりました。また、道路横断をしようとしている児童に気付き、停車して安全な横断に協力してくれる車両が増えました。



注意喚起の看板設置



香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

⑧ 「北佐原小学校 県道101号（利根川堤防手前付近道路）」



横断歩道の移設と待機場所の設置

安全対策内容

- ◆横断歩道を移設するとともに、歩行者待機場所を設置しました。
- ◆停止線、ダイヤモンドマーク、外側線、センターライン、減速マークを引き直しました。

対策後の効果

- ★横断歩道の移設と待機場所の設置により、児童の道路横断の安全性が高まりました。
- ★道路標示の引き直しにより、全般的に横断箇所付近の通行車両の速度低減につながりました。



減速マーク、ダイヤモンドマーク等の引き直し

香取市通学路交通安全プログラム
平成26年度 合同点検及び安全対策箇所

⑨ 「香取小学校 県道55号千葉交通野口前バス停付近道路」

吉原

ホテルメモリアル2

安全対策内容

◆横断歩道設置と歩行者待機場所を設置しました。

対策後の効果

★横断歩道設置により、児童の道路横断に対する通行車両の認知度が高まり、道路横断の安全性が高まりました。また、全般的に横断箇所付近の通行車両の速度低減につながりました。

大川運輸

吉原

篠塚印刷

H2

篠塚自動車

多田

セブンイレブン

和島工業

香取CC社宅

CC管理棟

割烹丸光亭



横断歩道の設置
